

経済常任委員会所管事務調査日程

日 時 平成 28 年 11 月 4 日 (金)

13 : 30 ~ 15 : 30

場 所 委員会室

第 1 道路整備計画について

(1) 説 明

- ・町内道路計画（国・県・町道）の状況及び道路整備の構想
- ・社会資本整備総合交付金事業等^①圃場事業計画及び実績

補中

(2) 質 疑

(3) 討 議

(説明員退席)

(4) まとめ (本日の調査)

第 2 その他 (次回の調査内容等)

経済常任委員会説明資料

平成28年11月4日(金)

まち整備課

1 道路現況表

(1) 埴町内における国道及び県道 道路現況表

平成27年4月1日現在

道路種別	総延長 (m)	重用 延長 (m)	未供用 延長 (m)	実延長 (m)	実延長の改良済・未改良別内訳								舗装・未舗装別内訳					
					規格改良済				未改良				舗装済道				砂利道	
					5.5m以上のみ		5.5m未満を含む		自動車交通不能		簡舗を含まない		簡舗を含む		延長(m)		%	
					延長(m)	%	延長(m)	%	延長(m)	%	延長(m)	%	延長(m)	%				
国道	24,576	0	0	24,576	19,386	78.9	21,760	88.5	2,816	11.5	0	0.0	15,909	64.7	24,576	100.0	0.0	0.0
主要地方道	24,514	1,181	0	23,333	15,331	65.7	20,088	86.1	3,245	13.9	0	0.0	12,258	52.5	23,333	100.0	0.0	0.0
一般県道	44,525	4,588	0	39,937	12,436	31.1	23,652	59.2	16,285	40.8	0	0.0	15,073	37.7	39,937	100.0	0.0	0.0
合計	93,615	5,769	0	87,846	47,153	53.7	65,500	74.6	22,346	25.4	0	0.0	43,240	49.2	87,846	100.0	0.0	0.0


※砂利道には、防塵処理工等を含む。

2 整備計画

番号	路線名	事業名	公共 県単	事業箇所	全体計画				平成27年度 迄の事業費 (千円)	平成28年度(予定)		平成29年度 以降事業費 (千円)	備考	
					延長 (m)	幅員 (m)	事業費 (千円)	事業年次		事業概要	事業費 (千円)			
								着手						完了
①	埴大津港線	交付金事業(道路) (再生・復興)	公共	埴町川上地内 【道場橋】	67	(10.5) 6.0	84,000	H26	H28	44,000	耐震補強 完了	40,000	0	棚倉土木
②	埴大津港線	交付金事業(道路)	県単	埴町川上地内 【川上工区】	370	(8.75) 5.5	600,000	H22	H30	287,350	用地補償 物件調査	40,000	272,650	県南建設 道路課
③	埴大津港線	交付金事業(地活)	公共	埴町大藤地内	2,400	(7.5) 5.5	134,000	H23	H29	74,000	舗装補修	26,000	34,000	棚倉土木
④	高萩橋線	交付金事業(道路) (再生・復興)	公共	埴町片貝地内	700	3~4	350,000	H24	H29	206,000	道路改良(災害防除) 2ヶ所	90,000	54,000	棚倉土木
⑤	高萩橋線	道路橋りょう改良事業	県単	埴町木野反地内 【木野反工区】	1,600	(7.5) 5.5	950,000	H16	H35	391,507	道路詳細設計 地質調査	15,000	543,493	県南建設 道路課
⑥	矢祭山八幡線	交付金事業(道路)	県単	埴町伊香地内 【赤沢橋工区】	235	(10.0) 6.0	400,000	H25	H33	12,724	物件調査 用地補償	20,000	367,276	県南建設 道路課
⑦	赤坂東野橋線	交付金事業(道路)	県単	埴町常世北野地内 【赤坂橋】	730	(9.75) 6.0	775,000	H14	H28	745,000	改良舗装工 完了予定	30,000	0	県南建設 道路課
計					6,102		3,293,000			1,760,581		261,000	1,271,419	

H29~着工

埴町内におけるH28事業箇所図 < 県南建設事務所・棚倉土木事務所 >

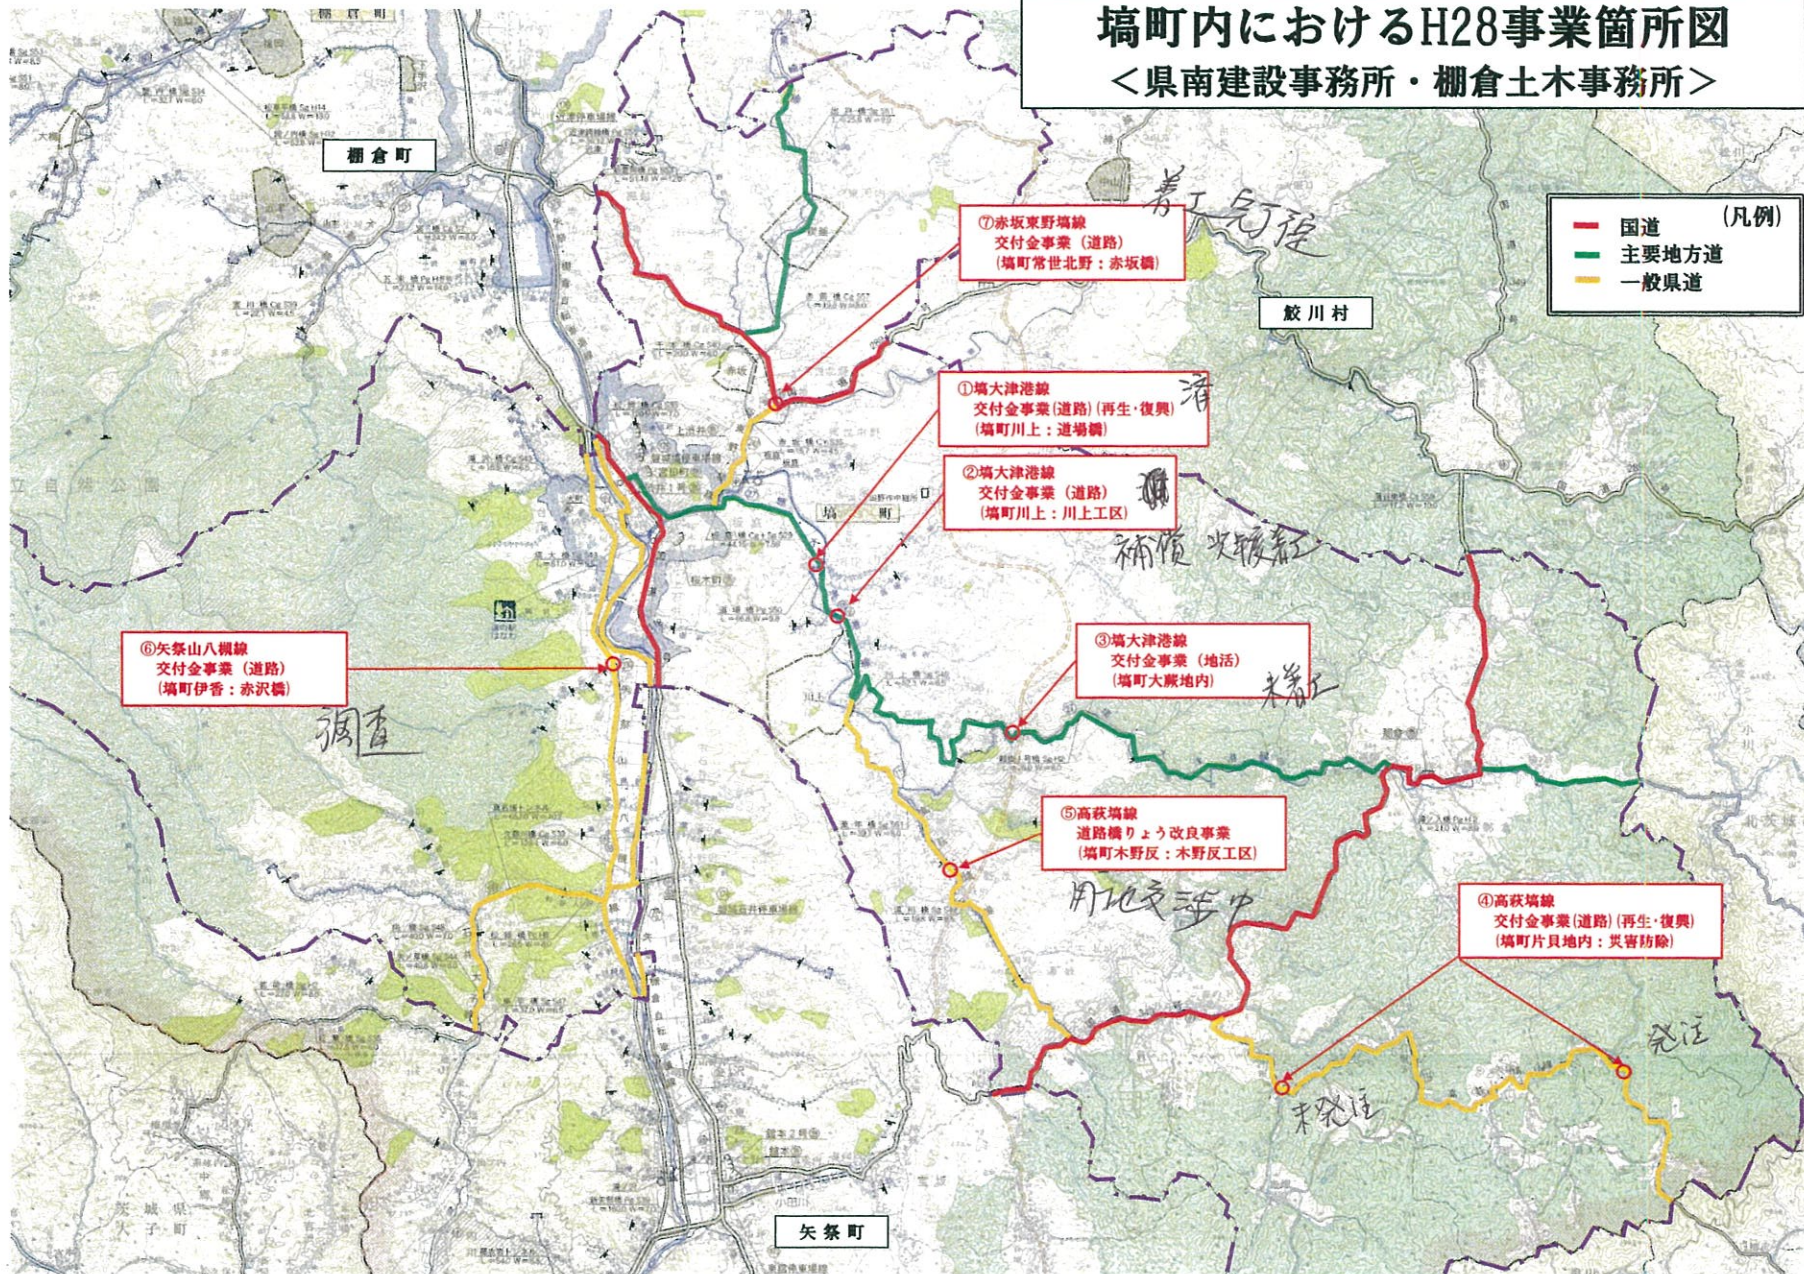

資料2

事業名	社会資本整備総合交付金事業
路線名	町道板庭田の作湯船線
事業量	延長L=640.0m、幅員W=4.0(5.0)m

年度	計画		実績			
	項目	内容	事業費(千円)	項目	内容	進捗率(計画)
24	測量試験費 用地補償費	道路測量設計・橋梁予備設計 A=1,414.3㎡	23,000	測量試験費 用地補償費	道路測量設計・橋梁予備設計 A=1,149.71㎡	6% (6%)
25	測量試験費 工事費 用地補償費	橋梁詳細設計 旧橋撤去・道路改良工L=567.7m 補償4件	62,800	測量試験費 工事費 用地補償費	橋梁詳細設計 改良工L=450.0m A=264.59㎡、補償4件	23% (40%)
26	工事費	道路改良工L=117.7m 旧橋撤去・P1橋脚N=1.0基	49,900	工事費 用地補償費	旧橋撤去・P1橋脚1基 A=949.9㎡	36% (60%)
27	工事費	A1A2橋台N=各1基、上部工製作	69,500	工事費	A2橋台1基・改良工L=117.7m 中取	54% (81%)
28	工事費	上部工架設・舗装	103,100	工事費	A1橋台1基・上部工製作 板底	81% (100%)
29			70,000 要望額	工事費	上部工架設・舗装	100%

資料3

事業名	社会資本整備総合交付金事業
路線名	町道桜木町末広線
事業量	延長L=560.0m

年度	計画		実績			
	項目	内容	事業費	項目	内容	進捗率(計画)
24	測量試験費	道路測量設計	2,257千円	測量試験費	道路測量設計	5% (5%)
25	工事費	改良工L=200.0m	12,369千円	工事費	改良工L=72.5m	18% (40%)
26	工事費	改良工L=200.0m	42,712千円	工事費	改良工L=101.5m	36% (80%)
27	工事費	改良工L=160.0m	30,910千円	工事費	改良工L=96.0m	53% (100%)
28			39,171千円 <i>39,171千円</i>		休止	
29			72,000千円 要望額	工事費	改良工L=290.0m	100%

資料4

事業名	社会資本整備総合交付金事業
路線名	町道川上東河内線
事業量	延長L=340.0m、幅員W=5.5(8.75)m

年度	計画		実績			
	項目	内容	事業費(千円)	項目	内容	進捗率(計画)
27	測量試験費 用地補償費	道路測量設計・橋梁予備設計 A=1,000㎡	27,000 <i>20000</i>	測量試験費	道路測量設計・橋梁予備設計	4% (6%)
28	測量試験費 工事費 用地補償費	橋梁詳細設計・物件調査 道路改良工L=60.0m 補償1件 A=2,600㎡	<i>7000</i>	用地補償費 (8筆越)	A=1,000㎡(H27繰越)6,696千円	6% (20%)
29	工事費	A1A2橋台N=各1基	30,000 要望額	測量試験費 用地補償費	橋梁詳細設計・物件調査 A=2,600㎡	11% (55%)
30	工事費	道路改良工L=240.0m 上部工製作				(80%)
31	工事費	上部工架設・舗装				(100%)
32						
